投标技术标（监理大纲）

预览项目

预览企业

目 录

第一章 工程概况与监理工作范围 3

一、工程概况 3

（一）项目理解 3

1. 监理工作范围 4

第二章 监理工作依据、目标与内容 5

一、监理工作依据 5

（一）监理工作目标 5

1. 监理工作制度 5

第三章 项目监理机构及人员配备 6

一、项目监理机构 6

（一）人员配备 6

1. 仪器设备配置 6

第一章 工程概况与监理工作范围

一、工程概况

预览项目为框架剪力墙结构公共建筑，总建筑面积约 8.6 万平方米，地上十层、地下两层。

（一）项目理解

本项目监理工作覆盖质量、进度、投资、安全环保与合同信息管理五大目标。

- 质量控制：材料进场验收与旁站监理
- 进度控制：总控计划动态纠偏

表 1-1

序号	控制目标	主要措施
1	质量目标	三检制、样板引路
2	进度目标	关键线路周报纠偏



图 1-1　施工现场全景

现场主体结构已施工至十层，安全防护与绿色施工措施同步落实。

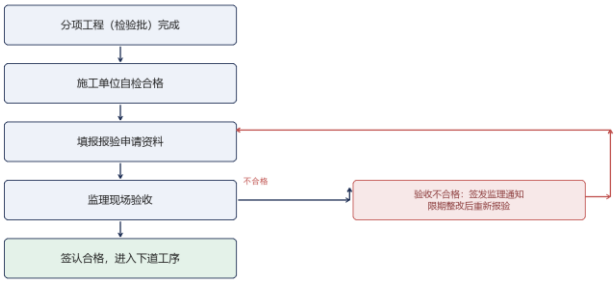


图 1-2　质量控制验收程序流程图

质量控制执行报验制与旁站制，不合格项限期整改后重新报验，合格后方可进入下道工序。

1. 监理工作范围

施工阶段监理，含土建、安装、装饰、智能化、室外工程等全部专业。

第二章 监理工作依据、目标与内容

一、监理工作依据

- 国家和地方有关工程建设的法律、法规与规章；
- 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013。



图 2-1　现场水准测量

现场监理人员正在开展水准测量放线复核，实测实量数据同步录入监理台账。



图 2-2　监理工作程序流程图

项目监理机构按照既定工作程序有序推进三控两管一协调，竣工验收合格后签发工程移交证书。

（一）监理工作目标

质量达到一次性验收合格标准；进度满足合同节点要求；投资控制在批准概算内。

1. 监理工作制度

建立监理例会、旁站监理、见证取样、巡视检查、资料管理制度。

第三章 项目监理机构及人员配备

一、项目监理机构

实行总监理工程师负责制，设总监理工程师 1 名、专业监理工程师 5 名、监理员 4 名。

（一）人员配备

表 3-1

岗位	人数	资格要求
总监理工程师	1	注册监理工程师、高级职称
专业监理工程师	5	中级及以上职称

1. 仪器设备配置

配备全站仪、水准仪、回弹仪等常规检测仪器及监理信息化管理平台。

- 全站仪、水准仪、回弹仪等常规检测仪器
- 监理信息化管理平台



图 3-1　监理例会图纸会审

监理例会与图纸会审制度保障参建各方信息畅通，重大问题及时协调解决。
